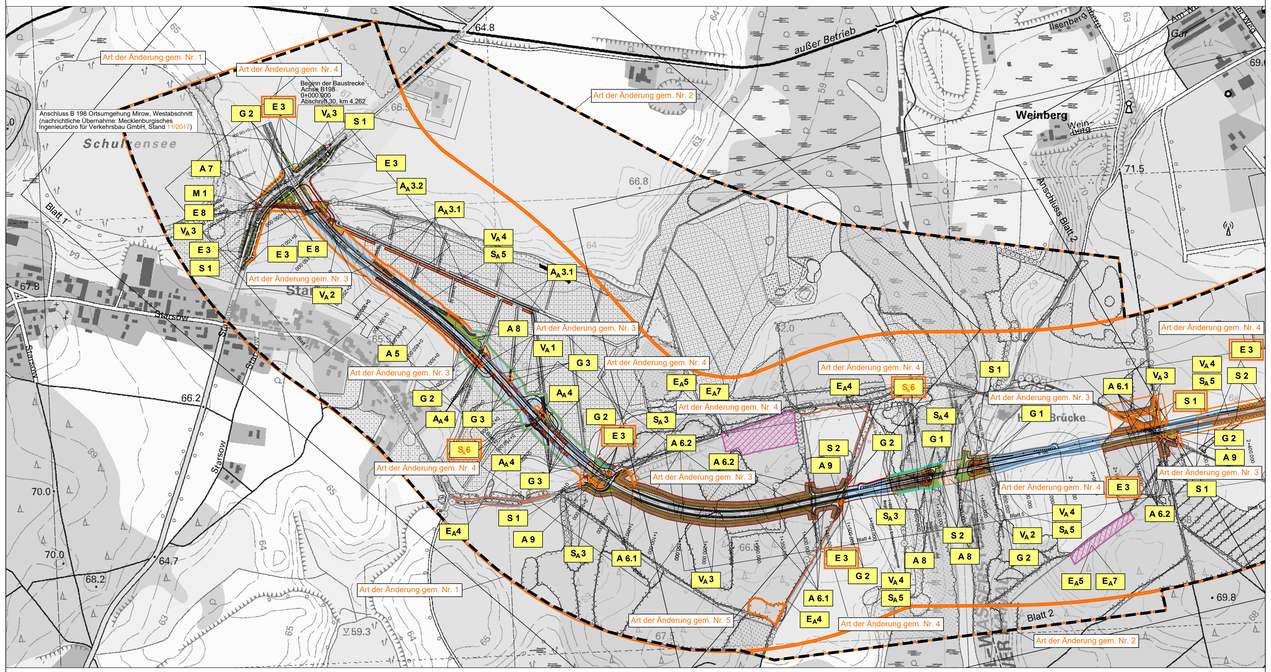

LEGENDE

MAßNAHMEN

Vermeidungsmaßnahmen

- V_A 1 — Fischottergerechte Ausführung der Bauwerke BW 1S, BW 2S und BW 3S
- V_A 2 — Bauzeitenregelung zum Schutz des Fischotters sowie der Wasser- und Teichfledermaus
- V_A 3 — Bauzeitenregelung zum Schutz der Fledermäuse und Gehölzbrüter, Untersuchung von Höhlen vor Fällung
- V_A 4 — Bauzeitenregelung zum Schutz der Brutvögel im Offenland

Minderungsmaßnahmen

- M 1 — Verzicht auf das Baufeld im Bereich hochwertiger Biotope

Schutzmaßnahmen

- S 1 — Schutz von Einzelbäumen durch einen Schutzzaun
- S 2 — Schutz von wertvollen Biotopflächen durch einen Schutzzaun
- S_A3 — Aufstellen temporärer Sperrzäune, Abfangen und Aussetzen von Zauneidechsen
- S_A4 — Errichten von Irritations-/ Kollisionsschutzwänden
- S_A5 — Baufeldmarkierung mit Pfählen und Flatterband zum Schutz der Feld- und Heidelerche
- S_A6 — Aufstellen und Vorhalten temporärer Sperrzäune für Amphibien

Ausgleichsmaßnahmen

- A_A3.1 — Neuanlage gewässerbegleitender Gehölzstrukturen als Deckungsstrukturen für den Fischotter (CEF-Maßnahme)
- A_A3.2 — Neuanlage straßenbegleitender Gehölzstrukturen mit Überhältern zur Abschirmung von Bauwerken für den Fischotter
- A_A4 — Neuanlage gewässerbegleitender Gehölzstrukturen zur Abschirmung von Bauwerken für den Fischotter
- A 5 — Neuanlage straßenbegleitender Gehölzstrukturen zur landschaftsgerechten Einbindung der Trasse
- A 6.1 — Sukzessive Entwicklung in Randbereichen angeschnittener Waldbestände
- A 6.2 — Wiederherstellung Waldmantel durch Einzelbaumentnahme und Sukzession angeschnittener Bestände
- A 7 — Pflanzung von Einzelbäumen bzw. Baumgruppen
- A 8 — Sukzession nach Wiederherstellung im Baufeld
- A 9 — Neuanlage von Gehölzstrukturen

Ersatzmaßnahmen

- E 3 — Neupflanzung von Bäumen
- E_A4 — Aufwertung des Lebensraumes der Zauneidechse mit Lesesteinen und Totholz (CEF-Maßnahme)
- E_A5 — Ersatz von Fledermausquartieren durch Anbringen von Fledermauskästen (CEF-Maßnahme)
- E_A7 — Ersatz von Bruthöhlen durch Anbringen von Nistkästen (CEF-Maßnahme)
- E 8 — Herstellung eines Trockendurchlasses für den Fischotter unter der L 25, einschließlich Sperrzäunen sowie Grabenöffnung und Gestaltung von Freiflächen

Gestaltungsmaßnahmen

- G 1 — Dichte Bepflanzung von Böschungen am Bauwerk BW 5S mit Sträuchern und Heistern
- G 2 — Ansaat von Landschaftsrasen
- G 3 — Lockere Bepflanzung von Böschungen mit Sträuchern

SONSTIGES

- Grenze des Plangebietes
- Biotopbestand (vgl. Unterlage 12.5.1 Realnutzung und Biotoptypen)
- Trasse der geplanten OU Mirow Südabschnitt (nachrichtliche Übernahme: Mecklenburgisches Ingenieurbüro für Verkehrsbau GmbH, Stand 11/2017)
- Blattschnitte der Unterlage 12.2.1 Lageplan Maßnahmen trassennah, M 1 : 500
- Blattschnitte der Unterlage 12.5.1 Realnutzung und Biotoptypen, M 1 : 2.500
- Bereich mit Planänderungen/ -ergänzungen

Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist eine konsequente Anwendung der einheitlichen Gestaltung für Landschaftspflegerische Begleitpläne im Straßenbau (Musterkarten LBP, 1998) nicht umsetzbar. So werden nicht die einzelnen Landschaftspflegerischen Maßnahmen beschildert, sondern lediglich eine Übersicht über die im Lageplan vorhandenen Maßnahmen zusammenfassend dargestellt.

Die entsprechenden trassennahen Landschaftspflegerischen Maßnahmen werden in der Unterlage 12.2.1, Lageplan Maßnahmen trassennah sowie der Unterlage 12.3.2, Übersichtsplan Maßnahmen für den Artenschutz konkretisiert.

Landschaftspflegerischer Begleitplan

B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt

Übersicht Maßnahmen trassennah

Blattübersicht



0 100 200 300 400 500

Nr.	Art der Änderung	Datum	Aufgestellt
5	Entfall der Maßnahme E_A 6 aufgrund aktueller Kartierungen	05.03.2018	Langer
4	Ergänzung und Anpassung landschaftspflegerischer Maßnahmen nach Überarbeitung	05.03.2018	Langer
3	nachrichtliche Übernahme techn. Änderungen (vgl. Unterlage 7, M/V Neustrelitz, 11/2017)	05.03.2018	Langer
2	Erweiterung des Untersuchungsraums Biotoptypenkartierung zur Plausibilisierung der UVS	05.03.2018	Langer
1	Aktualisierung der Biotoptypenkartierung (PLAN AKZENT Rostock, 2016)	05.03.2018	Langer

PLAN AKZENT ROSTOCK
LANDSCHAFTSARCHITEKTIN ELKE RINGEL
Landschaftsplanung
Objektplanung
Bauleitplanung
Landschaftsökologie
Dehmelstraße 4 18055 Rostock Tel.: (03 81) 86 51 28-0 Fax: (03 81) 86 51 28-21

	bearbeitet	Datum	gezeichnet	Datum	geprüft	Datum
	Wanke	03/2018	Wanzek	03/2018	Langer	03/2018

MECKLENBURGISCHES INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN
ZWEIGNIEDERLASSUNG NEUSTRELITZ
Tiergartenstr. 21, 17235 Neustrelitz
Telefon: 03981/4587-0
Telefax: 03981/4587-27
E-Mail: zentrale@miv-neustrelitz.de
gez. Schneider
Leiter der Zweigniederlassung
Neustrelitz, März 2018

	Datum	Zeichen
Bearb.:	März 2018	Wanko
Gez.:	März 2018	Wanzek
Gepr.:	März 2018	Schneider

STRASSENBAUVERWALTUNG LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN

Straße: B 198
(nächster Ort): Mirow
Bau-km -0+026.939 bis Bau-km 4+930.000

Unterlage Nr. 12.2.3
Blatt Nr. N1
Reg.Nr.

Planfeststellung

B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt

	Datum	Zeichen
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft	März 2018	gez. i.A. Nickel

Übersichtsplan Maßnahmen trassennah

Maßstab 1 : 5.000

Aufgestellt
Straßenbauamt Neustrelitz

gez. Krage
Neustrelitz, März 2018
